


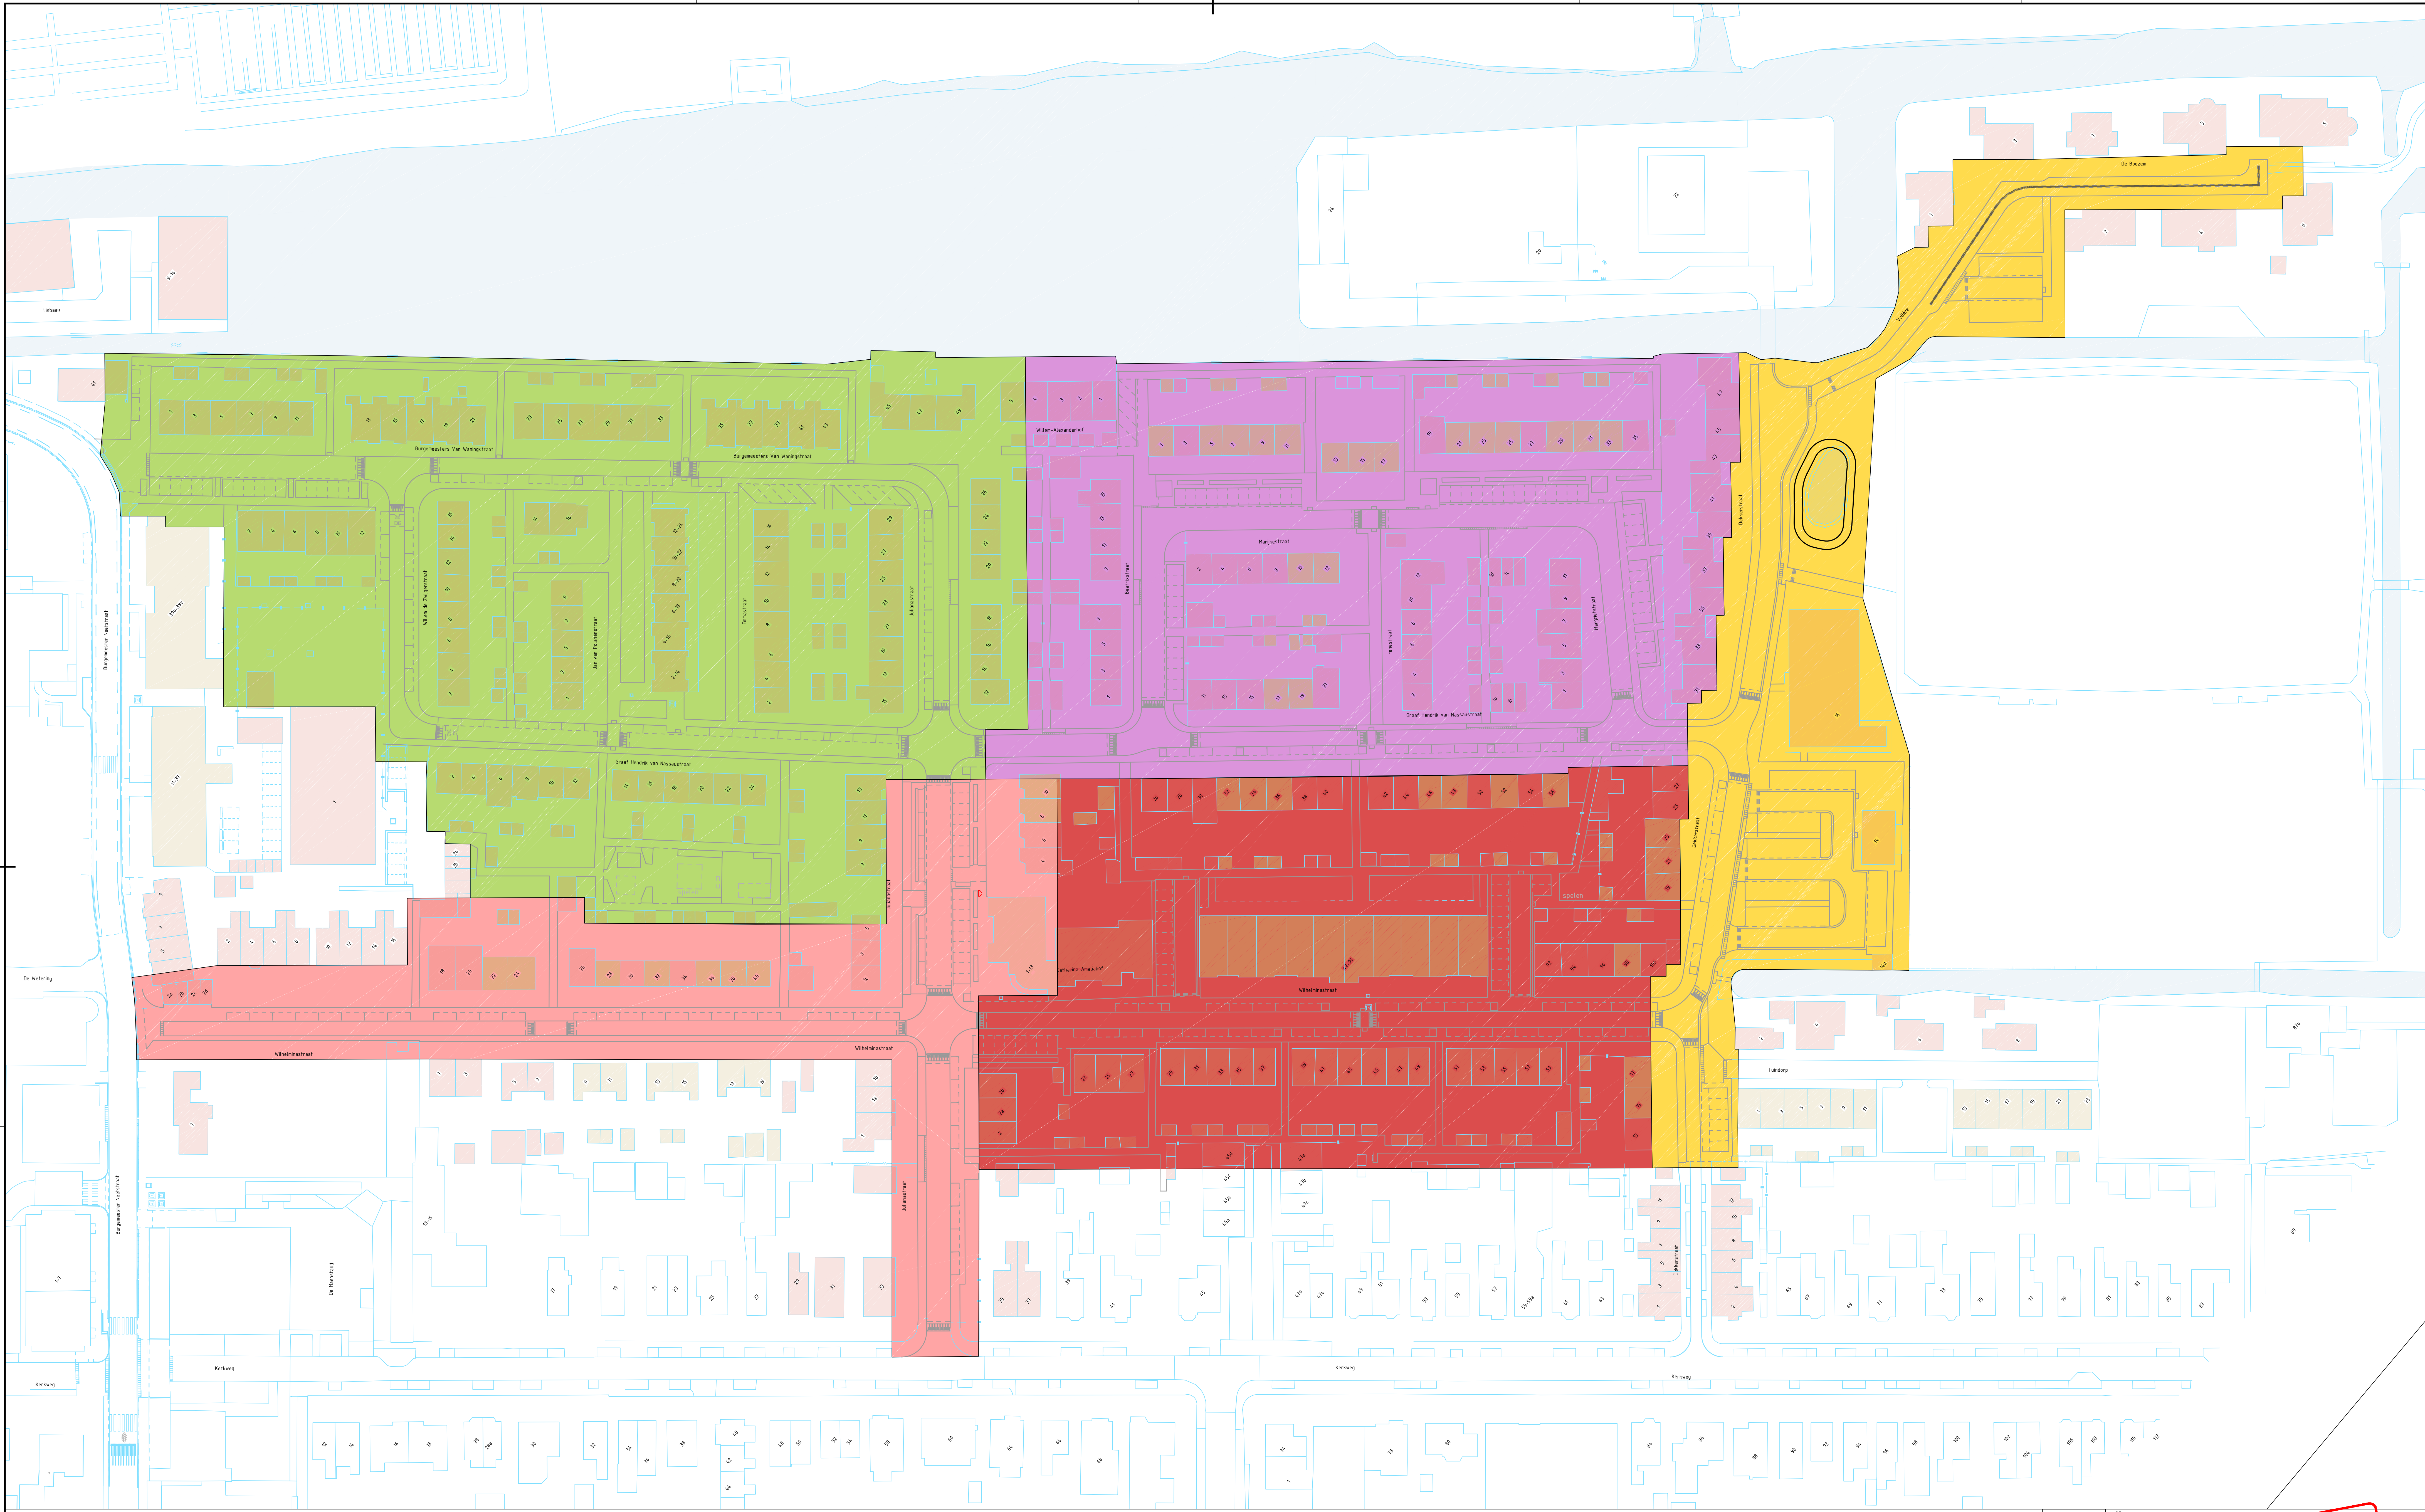

FASERING / WERKVAKKEN


- WERKVAK 1**
NUTSWERKZAAMHEIDEN
1e Fase: vervanging gas, water en elektrika - november - december (2024)
2e Fase: ripen K&L na ophefing - maart (2025)
CIVIEL
1e Fase: riool - maart - mei (2025)
2e Fase: bestrating - juni - september (2025)
- WERKVAK 2**
NUTSWERKZAAMHEIDEN
1e Fase: vervanging gas, water en elektrika - januari - februari (2025)
2e Fase: ripen K&L na ophefing - mei - juni (2025)
CIVIEL
1e Fase: riool - juni - juli (2025)
De Boezem - september (2025)
2e Fase: bestrating - oktober - november (2025)

- WERKVAK 3**
NUTSWERKZAAMHEIDEN
1e Fase: vervanging gas, water en elektrika - peried
2e Fase: ripen K&L na ophefing - juli - augustus (2025)
CIVIEL
1e Fase: riool - juli - augustus (2025)
2e Fase: bestrating - december (2025) - februari (2026)
- WERKVAK 4**
NUTSWERKZAAMHEIDEN
1e Fase: vervanging gas, water en elektrika - peried
2e Fase: ripen K&L na ophefing - oktober - november (2025)
CIVIEL
1e Fase: riool - oktober - december (2025)
2e Fase: bestrating - maart - juni (2026)

- WERKVAK 5**
NUTSWERKZAAMHEIDEN
1e Fase: vervanging gas, water en elektrika - gered
CIVIEL
1e Fase: riool - januari - februari (2026)
2e Fase: bestrating - juli - september (2026)

BESTAAND

- BEBODING (ROOP)
BEBODING (HOUT) (HETWONEN)
BEBODING (HOUT) (OUWONEN)
WATERRIEG



BT	06-05-25	A.M.	M.S.Z.
MT	06-05-25	A.M.	M.S.Z.
ET	06-05-25	A.M.	M.S.Z.
DD	11-01-25	A.M.	M.S.Z.
VO	11-01-25	A.M.	M.S.Z.
SD	11-01-25	A.M.	M.S.Z.
versie	datum	getekend	gecontroleerd

Ouderkerk aan den IJssel
Reconstructie Wilhelminastraat e.o.
Burg. van Waningsstr, Dekkerstr, Julianastr.
Graaf Hendrik van Nassaustr. en de Boezem e.o.
Werktekening
Fasering Civiel (naandniveau)

tekening: OIJ2001-WTd
bladen: 1869 van ** bladen
schaal: 1 : 500
formaat: A0

datum: 06-05-2025
getekend: A. Hartens
geautoriseerd: H. de Zoete

