Planning 4426601 Middelgroot asfaltonderhoud Krimpen aan de Lek
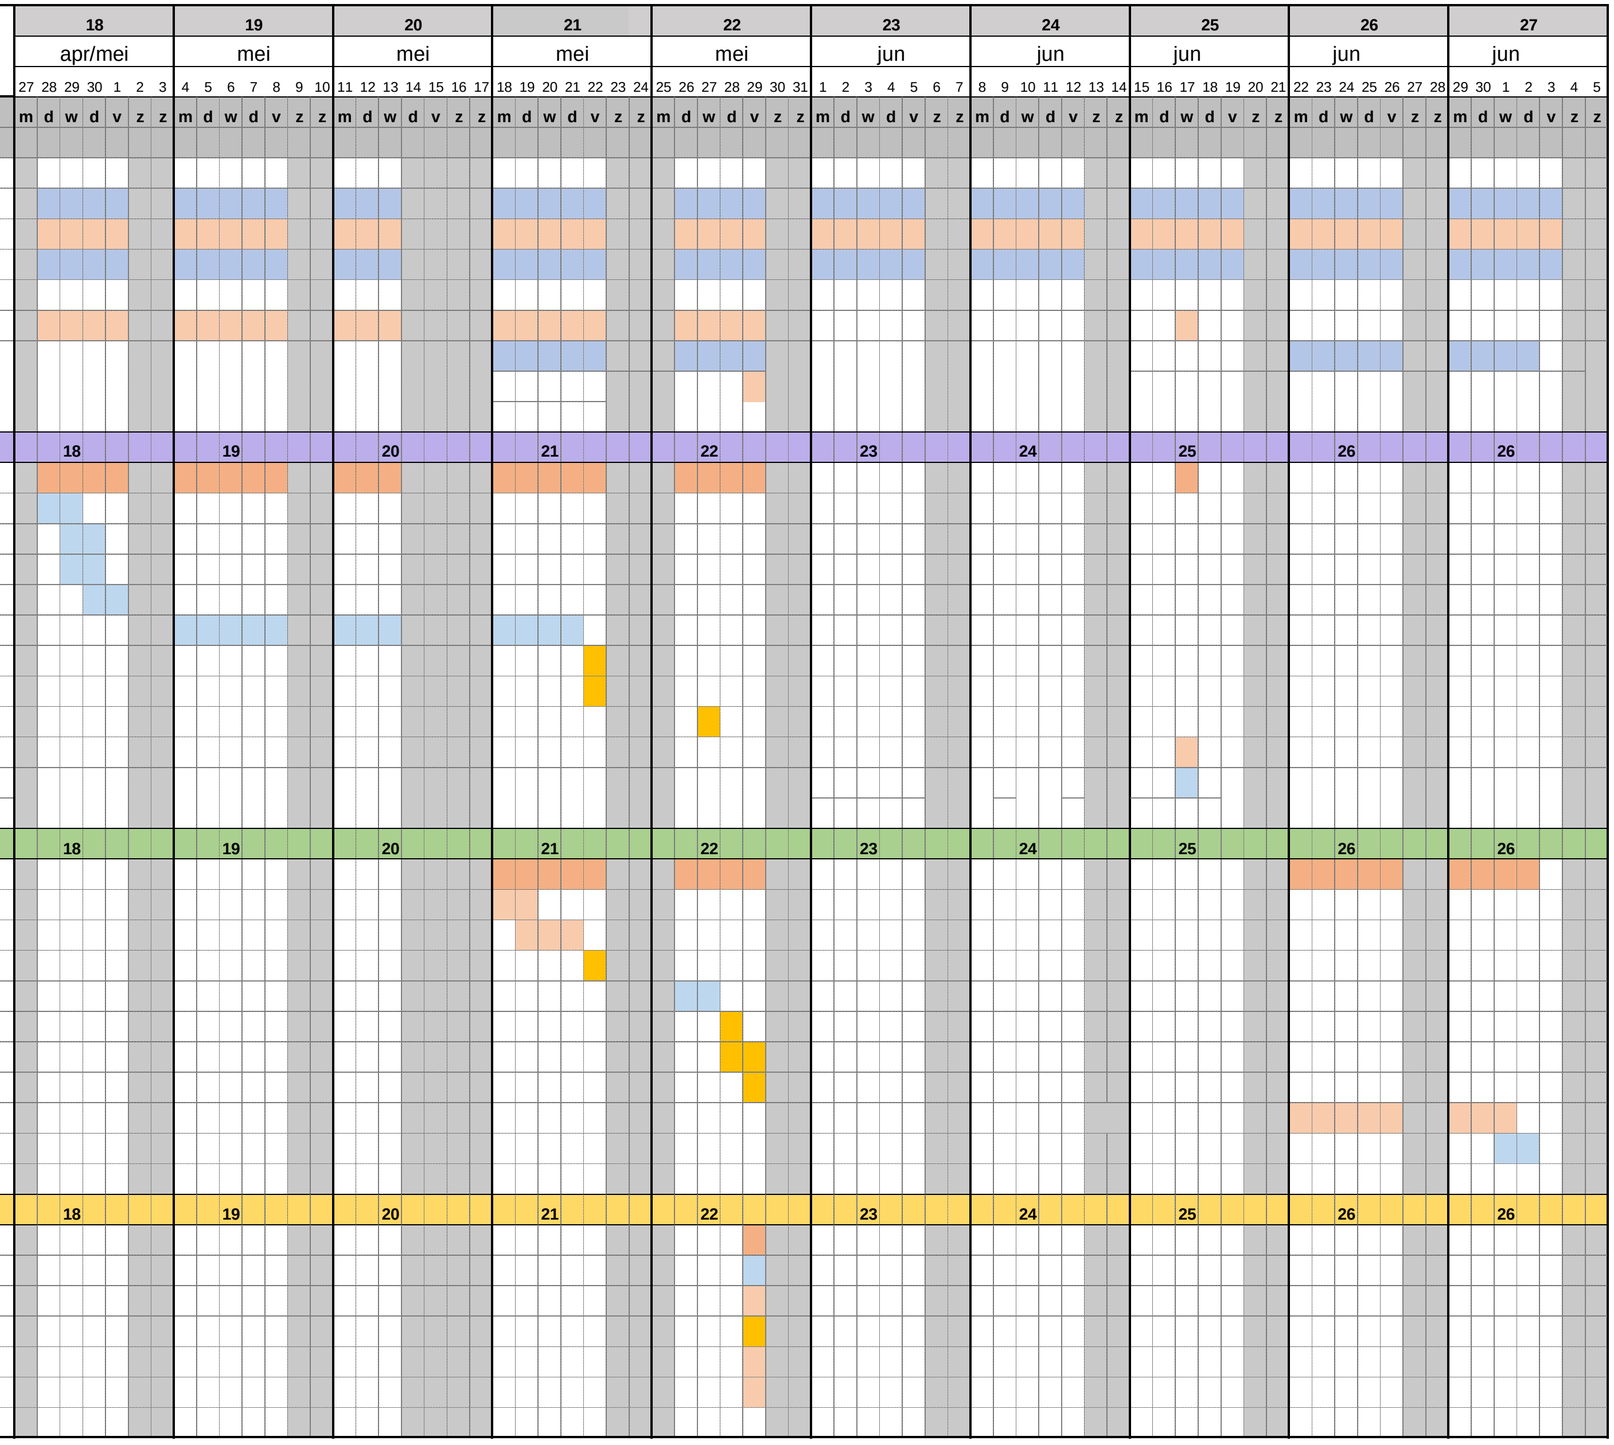
Post	Werkomschrijving	opmerkingen
	Voorbereidend werk gehele werkvak	
Maandag 20-4	Plaatsen parkeer verboden en vooraankondigingen	
	Toepassen maatregelen BLVC	
	Toepassen stamommanteling tbv bescherming boom	
	Toepassen Tijdelijke depots	
	Toepassen VKM Vak 1 Onder de Waal	
	Toepassen VKM Vak 2 Ooster Lekdijk - Schuwacht	
	Toepassen VKM Vak 3 Hoofdstraat	
	Vak 1 Onder de Waal	
	Toepassen VKM tekening "fase 3"	
	opbreken verharding teerhoudend	
	opbreken straatwerk inclusief kantopsluitingen	
	ontgraven zand	
	aanbrengen wegfundering incl kunstofinlage	
	aanbrengen kantopsluitingen en straatwerk + ophalen/vervangen kolken	
	aanbrengen asfalt OL	
	aanbrengen asfalt TL	
	aanbrengen asfalt DL	
	Aanbrengen coating (3wkn na aanbrengen asfalt)	
	aanbrengen markering (na aanbrengen coating)	
	Vak 2 (Ooster Lekdijk - Schuwacht)	
	Toepassen VKM tekening "fase 2"	
	werkzaamheden sloopvak nr. 30	
	werk aan leiding	
	Asfalteren OL sloopvakken	
	Frezen asfalt	
	aanbrengen asfalt OL	
	aanbrengen asfalt TL	
	aanbrengen asfalt DL	
	Aanbrengen coating (3wkn na aanbrengen asfalt)	
	aanbrengen markering (na aanbrengen coating)	
	Hoofdstraat	
	Toepassen VKM tekening "fase 1" halve baan afzetting	
	verwijderen verkeerszuilen voor hergebruik	
	frezen asfalt	
	aanbrengen asfalt 2 lagen incl wapening	
	aanbrengen markering	
	herstellen verkeerszuilen
