Fase 3: Week 10 tm 18 2027

Fase 4: Week 18 tm 28 2027

't Sandtpad

Populier

De Groeneboom

Abelenlaan

ABRI

1.275,06 m²

2.825,8 m²

GEBIED 1
GEBIED 2

P1 P2 P3 P4 P5 P6 P7 P8 P9

BESTAANDE SITUATIE:

- BESTAANDE SITUATIE
- 18 GEVELLIJN BEBOUWING MET HUISNUMMER
- WATERGANG
- HEKWERK
- PARKEREN OP EIGEN TERREIN

BESTAANDE RIOLERING:

- KAST RIOLERING HANDHAVEN / OP HOOGTE STELLEN (DOOR DEROEN)
- INSPECTIEPUT
- POMP- / OVERSTORT- / VERDEKTE PUT
- TROTTOIR- / STRAATKOLK

ONDERGRONDSE INFRA:

- BRANDKRAAN HANDHAVEN / OP HOOGTE STELLEN (DOOR DEROEN)
- WATERAFSLUITER HANDHAVEN / OP HOOGTE STELLEN (DOOR DEROEN)
- GASAFSLUITER HANDHAVEN / OP HOOGTE STELLEN (DOOR DEROEN)
- PEILBUIS HANDHAVEN / OP HOOGTE STELLEN (DOOR DEROEN)
- KAST OPENBARE VERLICHTING HANDHAVEN / OP HOOGTE STELLEN (DOOR DEROEN)
- KAST ELEKTRA HANDHAVEN / OP HOOGTE STELLEN (DOOR DEROEN)
- KAST DATA HANDHAVEN / OP HOOGTE STELLEN (DOOR DEROEN)

AAN TE BRENGEN OBJECTEN:

- LICHTMAST
- AFVALBAK
- ZITBANK - HOUT
- VERKEERSBORD MET BORDCODE / STRAATNAAMBORD
- KUNSTSTOF TROTTOIRPAAL STALEN BEWEEGBARE TROTTOIRPAAL
- LAADPAAL (DOOR DEROEN)
- BOVENGRONDSE CONTAINER
- ONDERGRONDSE CONTAINER (DOOR DEROEN)

GROENVOORZIENINGEN (ZIE GROENPLAN T09):

- PLANTEN HAAG (DOOR DEROEN)
- BESTAANDE BOOM
- NIEUWE BOOM (DOOR DEROEN)
- PLANTEN SOLITAIRS (DOOR DEROEN)

DIVERSEN:

- WERKTERREIN, VOOR ZOVER NIET AANGEGEVEN IS TOT AAN DE ERFGRENS WERKTERREIN
- 5.00 MAATVOERING
- Stp -0.79 BESTAANDE DORPEL / VLOER / STOEPHOOGTE
- -1.48 NIEUWE MAAIVELDHOOGTE
- -1.54 BESTAANDE (AANSLUITENDE) MAAIVELDHOOGTE
- TEKENBLADGRENS
- DWARSPROFIEL ZIE TEKENING T07 EN T08
- P1 ALLE AFMETINGEN IN METERS, TENZIJ ANDERS AANGEGEVEN

HOOGTEMATEN IN METERS T.O.V. NAP.
DETAILS IN MM

STROEFFEL GEBIED OUDERKERK
-2.33 m N.A.P.
Ijkelbesluit 2020

GRONDWERK

- AANBRENGEN BIMS
- AANBRENGEN ARGEXZAND INCL. STRAATLAAG1
- AANBRENGEN TEELAARDE OLEMAN TEELAARDE

NIEUWE RIOLERING:

- INSPECTIEPUT OP HOOGTE STELLEN
- TROTTOIRKOLK
- STRAAT- / TEGELPADKOLK
- LIJNKOLK

AAN TE BRENGEN KANTOPSLUITING:

- TROTTOIRBAND 150/150x250 MM
- TROTTOIRBAND 150/150x250 MM, MET STEUNRUG VAN STAMPBETON
- INRITVERLOOPBANDEN 130/150x170 MM
- OPSLUITBAND 60x200 MM
- OPSLUITBAND 100x200 MM
- OPSLUITBAND 150x250 MM
- HOEK- en BOCHTSTUKKEN
- VERLOOPBAND OB150 --> TB150
- INRITBAND 450x500x200 MM
- INRITBAND 350x500x200 MM

AAN TE BRENGEN VERHARDING:

- MATERIAALGRENS
- POLGOOT KEIFORMAAT ZWART
- BSW BETONTEGELS 300x300x45, MM HALFSTEENSVERBAND MET KLEUR
- BETONTEGELS 300x300x45 MM NOKKENTEGEL HALFSTEENSVERBAND MET KLEUR
- DK BETONSTRAATSTEEN DUBBELKLINKER 210x210x80 MM HALFSTEENSVERBAND MET KLEUR
- KF BETONSTRAATSTEEN ELLEBOOGVERBAND MET FORMAAT EN KLEUR
- KP BETONSTRAATSTEEN KEPERVERBAND MET FORMAAT EN KLEUR
- BETONSTRAATSTEEN HALFSTEENSVERBAND MET FORMAAT EN KLEUR
- H-STEEN HALFSTEENSVERBAND 100H DK, MET KLEUR
- 50x50 ZW RUBBERTEGELS HALFSTEENSVERBAND MET FORMAAT EN KLEUR
- GRASBETONPLAAT BLOKVERBAND, 1250x625x140 MM. ZIE DETAIL OP BLAD T09
- P-TEGEL/INVALIDE PARKEERPLAATS
- BETONTEGEL - P-TEGEL ELEKTRISCH VOERTUIG
- MARKERING - TALUDSTREPEN BETONSTRAATSTENEN WIT
- MARKERING - ONDERBROKEN STREEP BETONSTRAATSTENEN WIT-ZWART

KLEUR VERHARDING:


GR	GRIJS
RO	ROOD
ZW	ZWART

FORMATEN VERHARDING:

KP	KEIFORMAAT
DK	DUBBELKLINKER

OVERZICHT TEKENINGEN:

- BESTAANDE- EN TE VERWIJDEREN SITUATIE — BLAD T01 EN T02
- KABELS EN LEIDINGEN — BLAD T03 EN T04
- NIEUWE SITUATIE — BLAD T05 EN T06
- PROFIELEN — BLAD T07 EN T08
- DETAILS — BLAD T08
- GROENPLAN — BLAD T09

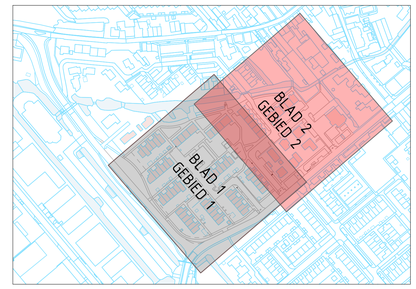

versie	datum	getekend	gecontroleerd
RT a			
WT a			
CT a	22-06-2026	B.A.M. Geerts	S. van Wingerden
DO a			
VO a			
SO a			

Ouderkerk aan den IJssel
Herstraten Bakwetering e.o.
Bakwetering, De Groeneboom,
Hennepwerf en Het Sandtpad
Contracttekening
Nieuwe Situatie - Gebied 2

Krimpenerwaard
Dorpsplein 8
2870AS Stolwijk
t: 0182
krimpenerwaard.nl

IBKW Ingenieursbureau Krimpenerwaard
Ingenieursbureau Krimpenerwaard
Raadhuisplein 4
2922 AD Krimpen aan den IJssel
ibkw.nl

tekening:	OU2501-CTa	datum:	22-06-2026
bladen:	T06 van 9 bladen	getekend:	B.A.M. Geerts
schaal:	1 : 200	geautoriseerd:	M. de Zoete
formaat:	A0		
